

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Observatorio Ciudadano Local

Los Mártires

Informe de Ejecución 2025

1 Presentación

En atención a la solicitud del Observatorio Ciudadano, se presenta el siguiente informe, que registra la ejecución de obras y recursos en la Localidad de Teusaquillo, durante la vigencia 2025.

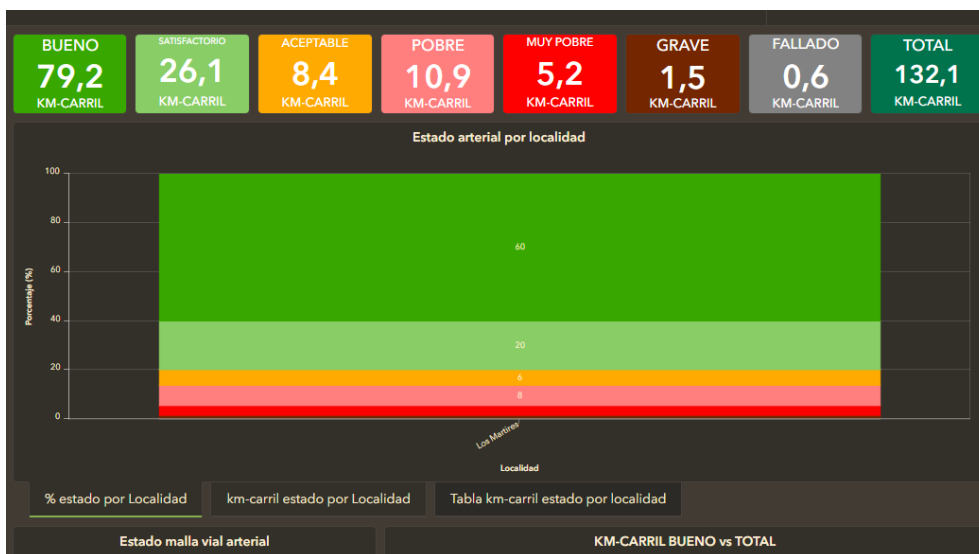
El informe presenta inicialmente el inventario de vías y espacio público de la ciudad y luego está organizado de acuerdo con la distribución de las áreas funcionales de la entidad: Proyectos, construcciones y conservación.

Es importante destacar que toda la información aquí contenida se puede consultar en la página web del Instituto: <https://www.idu.gov.co> y la información sobre el estado de las vías en el geoportal

<https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

2 Inventario de malla vial y espacio público de la localidad

2.1 Estado de la malla vial de la localidad



2.2 Estado del espacio Público de la localidad



De igual manera, se puede acceder a información como infografías por localidades, mediante el siguiente enlace:

<https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/pages/5cbe0b49256b47acb2b9adec0a313d0>

3 Proyectos ejecutados en la vigencia 2025


3.1. Proyectos de construcción


Contrato de obra IDU-1848-2021

Contrato de interventoría IDU-1853-2021

Actualización y/o complementación a los estudios y diseños y construcción de la ampliación de las estaciones. Grupo 4

Información contractual			
Número de contrato:	IDU-1848-2021	Número de contrato:	IDU-1853-2021
Tipo:	Contrato de Obra	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	COL PETROLEUM SERVICES S.A.S.	Contratista:	CONSORCIO RUTA JAL
Valor total:	\$ 50.998.132.990,00	Valor total:	\$ 4.138.107.894,00
Fecha de inicio:	27/01/2022	Fecha de inicio:	27/01/2022
Fecha de finalización:	19/11/2025	Fecha de finalización:	19/11/2025
Empleos generados:	6	Empleos generados:	19

Avance programado: 100,0% 

Avance ejecutado: 100,0% 

Estado del contrato: TERMINADO - ACTA EN FIRMAS

3.1 Proyectos de Conservación – Mantenimiento

Contrato de obra IDU-1689-2022

Contrato de interventoría IDU-1695-2022

Conservación puentes peatonales - Vigencia 202

Información contractual			
Número de contrato:	IDU-1689-2022	Número de contrato:	IDU-1695-2022
Tipo:	Contrato de Obra	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSORCIO PUENTES 8-11	Contratista:	CONSORCIO ECOSADING
Valor total:	\$ 23.834.882.543,00	Valor total:	\$ 3.447.647.990,00
Fecha de inicio:	17/01/2023	Fecha de inicio:	17/01/2023
Fecha de finalización:	24/02/2025	Fecha de finalización:	24/02/2025
Empleos generados:	0	Empleos generados:	0

Avance programado: 100,0% 
Avance ejecutado: 100,0% 
Estado del contrato: TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION



Contrato de obra IDU-1776-2021

Contrato de interventoría IDU-1783-2021

Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021

Información contractual

Número de contrato: IDU-1776-2021
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: CONSORCIO PROBOGOTA 22
Valor total: \$ 74.880.798.730,00
Fecha de inicio: 01/02/2022
Fecha de finalización: 31/07/2026
Empleos generados: 117

Número de contrato: IDU-1783-2021
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: CONSORCIO VÍAS AIRUG 2021
Valor total: \$ 11.617.934.360,00
Fecha de inicio: 01/02/2022
Fecha de finalización: 31/07/2026
Empleos generados: 33

Avance programado: 91,56% 
Avance ejecutado: 93,57% 
Estado del contrato: EN EJECUCION
